

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»

Контрольная работа
по дисциплине управления проектами на тему
«Организационный план проекта по созданию студии фото и
видеозаписи “KIM studio” при помощи Microsoft Project 2016»

Выполнил студент группы
№4191111 Ким В.А.
Принял доктор э.н., доцент кафедры
Производственного менеджмента
Пуряев А.С. _____

Набережные Челны 2022

Лист диаграммы Ганта первичный


Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
1		Проект "Создани студии для фото и видеозаписи"	182 дней	Чт 17.02.22	Пт 28.10.22													
2		ТЭО	41 дней	Чт 17.02.22	Чт 14.04.22													
3		Инициация	10 дней	Чт 17.02.22	Ср 02.03.22													
4		Экономическое обоснование	21 дней	Чт 03.03.22	Чт 31.03.22													
5		Взаимодействие с банками	7 дней	Пт 01.04.22	Пн 11.04.22													
6		Выделение и распределение финансирования	3 дней	Вт 12.04.22	Чт 14.04.22													
7		КТ1. Финансирование получено	0 дней	Чт 14.04.22	Чт 14.04.22													
8		Помещение	8 дней	Пт 15.04.22	Вт 26.04.22													
9		Поиск подходящих помещений	5 дней	Пт 15.04.22	Чт 21.04.22													
10		Заключение договора об аренде	3 дня	Пт 22.04.22	Вт 26.04.22													
11		КТ2. Договор об аренде подписан	0 дней	Чт 21.04.22	Чт 21.04.22													
12		Базовый ремонт помещения	49 дней	Пт 22.04.22	Ср 29.06.22													
13		Тендер	3 дня	Пт 22.04.22	Вт 26.04.22													
14		Заключение договора	4 дня	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22													
15		Предоплата (50%)	1 день	Вт 03.05.22	Вт 03.05.22													
16		Строительные работы	40 дней	Ср 04.05.22	Вт 28.06.22													
17		Конечная оплата	1 день	Ср 29.06.22	Ср 29.06.22													
18		КТ3. Завершен базовый ремонт	0 дней	Вт 28.06.22	Вт 28.06.22													
19		Проектирование дизайна студии	37 дней	Ср 27.04.22	Чт 16.06.22													
20		Тендер	4 дня	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22													

Лист диаграммы Ганта первичный







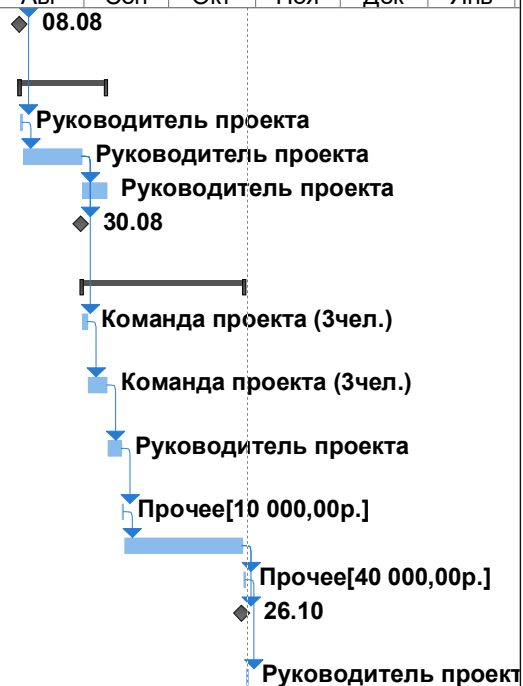












Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв
21		Заключение договора	2 дней	Вт 03.05.22	Ср 04.05.22													
22		Проектирование	30 дней	Чт 05.05.22	Ср 15.06.22													
23		Оплата	1 день	Чт 16.06.22	Чт 16.06.22													
24		КТ4. Дизайн студии спроектирован	0 дней	Ср 15.06.22	Ср 15.06.22													
25		Декоративный ремонт помещения	67 дней	Чт 05.05.22	Пт 05.08.22													
26		Тендер	5 дней	Чт 05.05.22	Ср 11.05.22													
27		Заключение договора	4 дня	Чт 12.05.22	Вт 17.05.22													
28		Предоплата (50%)	1 день	Ср 18.05.22	Ср 18.05.22													
29		Строительные работы	27 дней	Ср 29.06.22	Чт 04.08.22													
30		Конечная оплата	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22													
31		КТ5. Объект сдан в эксплуатацию	0 дней	Чт 04.08.22	Чт 04.08.22													
32		Обстановка мебели	2 дня	Пт 05.08.22	Пн 08.08.22													
33		Выбор и приобретение мебели	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22													
34		Мобилизация и расстановка мебели	1 день	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22													
35		КТ6. Мебель расставлена	0 дней	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22													
36		Закупка оборудования	10 дней	Пт 05.08.22	Чт 18.08.22													
37		Тендер	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22													
38		Оплата оборудования	1 день	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22													
39		Поставка оборудования	7 дней	Вт 09.08.22	Ср 17.08.22													
40		Монтаж	1 день	Чт 18.08.22	Чт 18.08.22													
41		КТ7. Оборудование введено в эксплуатацию	0 дней	Ср 17.08.22	Ср 17.08.22													
42		Создание рабочих условий	5 дней	Вт 09.08.22	Пн 15.08.22													

Лист диаграммы Ганта первичный

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023		
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв		
43		КТ8. Рабочие условия созданы	0 дней	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22															
44		Наем сотрудников	23 дней	Вт 09.08.	Чт 08.09.															
45		Подача объявления	1 день	Вт 09.08.	Вт 09.08.															
46		Собеседования	15 дней	Ср 10.08	Вт 30.08.															
47		Найм сотрудников	7 дней	Ср 31.08	Чт 08.09.															
48		КТ9. Сотрудники трудоустроены	0 дней	Вт 30.08.22	Вт 30.08.22															
49		Реклама	42 дней	Ср 31.08	Чт 27.10.															
50		Поиск рекламного агентства	2 дней	Ср 31.08.22	Чт 01.09.22															
51		Поставление рекламных целей	5 дней	Пт 02.09.22	Чт 08.09.22															
52		Заключение договора	3 дней	Пт 09.09.22	Вт 13.09.22															
53		Предоплата (20%)	1 день	Ср 14.09	Ср 14.09															
54		Рекламная акция	30 дней	Чт 15.09.	Ср 26.10															
55		Конечная оплата	1 день	Чт 27.10.	Чт 27.10.															
56		КТ10. Рекламная акция проведена	0 дней	Ср 26.10.22	Ср 26.10.22															
57		Сдача объекта в эксплуатацию	1 день	Пт 28.10.22	Пт 28.10.22															



Проект: msproj11
Дата: Вс 10.04.22

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Суммарная задача		Суммарная задача вручную	
Суммарная задача проекта		Только начало	
Внешние задачи		Только окончание	
Внешняя веха		Крайний срок	
Неактивная задача		Ход выполнения	
Неактивная веха		Выполнение задач, запланированных вручную	
Неактивная суммарная задача			

Лист диаграммы Ганта с критическим путем

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
1		Проект "Создани студии для фото и видеозаписи"	182 дней	Чт 17.02.22	Пт 28.10.22													
2		ТЭО	41 дней	Чт 17.02.22	Чт 14.04.22													
3		Инициация	10 дней	Чт 17.02.22	Ср 02.03.22													
4		Экономическое обоснование	21 дней	Чт 03.03.22	Чт 31.03.22													
5		Взаимодействие с банками	7 дней	Пт 01.04.22	Пн 11.04.22													
6		Выделение и распределение финансирования	3 дней	Вт 12.04.22	Чт 14.04.22													
7		КТ1. Финансирование получено	0 дней	Чт 14.04.22	Чт 14.04.22													
8		Помещение	8 дней	Пт 15.04.22	Вт 26.04.22													
9		Поиск подходящих помещений	5 дней	Пт 15.04.22	Чт 21.04.22													
10		Заключение договора об аренде	3 дня	Пт 22.04.22	Вт 26.04.22													
11		КТ2. Договор об аренде подписан	0 дней	Чт 21.04.22	Чт 21.04.22													
12		Базовый ремонт помещения	49 дней	Пт 22.04.22	Ср 29.06.22													
13		Тендер	3 дня	Пт 22.04.22	Вт 26.04.22													
14		Заключение договора	4 дня	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22													
15		Предоплата (50%)	1 день	Вт 03.05.22	Вт 03.05.22													
16		Строительные работы	40 дней	Ср 04.05.22	Вт 28.06.22													
17		Конечная оплата	1 день	Ср 29.06.22	Ср 29.06.22													
18		КТ3. Завершен базовый ремонт	0 дней	Вт 28.06.22	Вт 28.06.22													
19		Проектирование дизайна студии	37 дней	Ср 27.04.22	Чт 16.06.22													
20		Тендер	4 дня	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22													






















Лист диаграммы Ганта с критическим путем

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв
21		Заключение договора	2 дней	Вт 03.05.22	Ср 04.05.22													
22		Проектирование	30 дней	Чт 05.05.22	Ср 15.06.22													
23		Оплата	1 день	Чт 16.06.22	Чт 16.06.22													
24		КТ4. Дизайн студии спроектирован	0 дней	Ср 15.06.22	Ср 15.06.22													
25		Декоративный ремонт помещения	67 дней	Чт 05.05.22	Пт 05.08.22													
26		Тендер	5 дней	Чт 05.05.22	Ср 11.05.22													
27		Заключение договора	4 дня	Чт 12.05.22	Вт 17.05.22													
28		Предоплата (50%)	1 день	Ср 18.05.22	Ср 18.05.22													
29		Строительные работы	27 дней	Ср 29.06.22	Чт 04.08.22													
30		Конечная оплата	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22													
31		КТ5. Объект сдан в эксплуатацию	0 дней	Чт 04.08.22	Чт 04.08.22													
32		Обстановка мебели	2 дня	Пт 05.08.22	Пн 08.08.22													
33		Выбор и приобретение мебели	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22													
34		Мобилизация и расстановка мебели	1 день	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22													
35		КТ6. Мебель расставлена	0 дней	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22													
36		Закупка оборудования	10 дней	Пт 05.08.22	Чт 18.08.22													
37		Тендер	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22													
38		Оплата оборудования	1 день	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22													
39		Поставка оборудования	7 дней	Вт 09.08.22	Ср 17.08.22													
40		Монтаж	1 день	Чт 18.08.22	Чт 18.08.22													
41		КТ7. Оборудование введено в эксплуатацию	0 дней	Ср 17.08.22	Ср 17.08.22													
42		Создание рабочих условий	5 дней	Вт 09.08.22	Пн 15.08.22													

Лист диаграммы Ганта с критическим путем

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
43		КТ8. Рабочие условия созданы	0 дней	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22								◆ 08.08					
44		Наем сотрудников	23 дней	Вт 09.08.	Чт 08.09.								┌───┐					
45		Подача объявления	1 день	Вт 09.08.	Вт 09.08.								└─┘					
46		Собеседования	15 дней	Ср 10.08	Вт 30.08.								┌───┐					
47		Найм сотрудников	7 дней	Ср 31.08	Чт 08.09.								└─┘					
48		КТ9. Сотрудники трудоустроены	0 дней	Вт 30.08.22	Вт 30.08.22								◆ 30.08					
49		Реклама	42 дней	Ср 31.08	Чт 27.10.								┌───┐					
50		Поиск рекламного агентства	2 дней	Ср 31.08.22	Чт 01.09.22								└─┘					
51		Поставление рекламных целей	5 дней	Пт 02.09.22	Чт 08.09.22								┌───┐					
52		Заключение договора	3 дней	Пт 09.09.22	Вт 13.09.22								└─┘					
53		Предоплата (20%)	1 день	Ср 14.09	Ср 14.09								└─┘					
54		Рекламная акция	30 дней	Чт 15.09.	Ср 26.10								┌───┐					
55		Конечная оплата	1 день	Чт 27.10.	Чт 27.10.								└─┘					
56		КТ10. Рекламная акция проведена	0 дней	Ср 26.10.22	Ср 26.10.22								◆ 26.10					
57		Сдача объекта в эксплуатацию	1 день	Пт 28.10.22	Пт 28.10.22								└─┘					

Проект: msproj11
Дата: Вс 10.04.22

Задача		Только длительность	
Прерывание		Суммарное сведение вручную	
Веха		Суммарная задача вручную	
Суммарная задача		Только начало	
Суммарная задача проекта		Только окончание	
Внешние задачи		Крайний срок	
Внешняя веха		Критическая задача	
Неактивная задача		Критическое прерывание	
Неактивная веха		Ход выполнения	
Неактивная суммарная задача		Выполнение задач, запланированных вручную	
Задача вручную			

Лист диаграммы Ганта с базовым планом

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Результат	критерий оценки	Полугодие 1, 2 Полугодие 2, 2 Пс											
								Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
1		Проект " Создани студи	182 дней	Чт 17.02.	Пт 28.10.			0%											
2		ТЭО	41 дней	Чт 17.02.	Чт 14.04.	Финансирование одобрено	Финансирование получено	0%											
3		Инициация	10 дней	Чт 17.02.	Ср 02.03.	Протокол	Протокол утвержденный	0%											
4		Экономическое обс	21 дней	Чт 03.03.	Чт 31.03.	Разработан бизнес-план	Утвержденный бизнес-план	0%											
5		Взаимодействие с с	7 дней	Пт 01.04.	Пн 11.04.	Соглашение	Подписаное соглашение	0%											
6		Выделение и распр	3 дней	Вт 12.04.	Чт 14.04.	Финансирование одобрено	Финансирование получено	0%											
7		КТ1. Финансирование	0 дней	Чт 14.04.	Чт 14.04.			14.04											
8		Помещение	8 дней	Пт 15.04.	Вт 26.04.	Составление договора с арен	Договор об аренде подписан	0%											
9		Поиск подходящих	5 дней	Пт 15.04.	Чт 21.04.	Найдены подходящие помещ	Составлен список помещений	0%											
10		Заключение догово	3 дней	Пт 22.04.	Вт 26.04.	Составление договора с арен	Договор об аренде подписан	0%											
11		КТ2. Договор об арен	0 дней	Чт 21.04.	Чт 21.04.			21.04											
12		Базовый ремонт пом	49 дней	Пт 22.04.	Ср 29.06.	Завершение строительства	Акт сдачи	0%											
13		Тендер	3 дней	Пт 22.04.	Вт 26.04.	Определен победитель	Протокол тендера	0%											
14		Заключение догово	4 дней	Ср 27.04.	Пн 02.05.	Договор заключен	Договор подписан	0%											
15		Предоплата (50%)	1 день	Вт 03.05.	Вт 03.05.	Предоплата	Платежное поручение	0%											
16		Строительные рабс	40 дней	Ср 04.05.	Вт 28.06.	Завершение строительства	Акт сдачи	0%											
17		Конечная оплата	1 день	Ср 29.06.	Ср 29.06.	Конечная оплата	Платежное поручение	0%											
18		КТ3. Завершен базовь	0 дней	Вт 28.06.	Вт 28.06.			28.06											
19		Проектирование диз	37 дней	Ср 27.04.	Чт 16.06.	Завершение проектирование	Дизайн студии	0%											
20		Тендер	4 дней	Ср 27.04.	Пн 02.05.	Определен победитель	Протокол тендера	0%											
21		Заключение догово	2 дней	Вт 03.05.	Ср 04.05.	Договор заключен	Договор подписан	0%											
22		Проектирование	30 дней	Чт 05.05.	Ср 15.06.	Завершение проектирование	Дизайн студии	0%											
23		Оплата	1 день	Чт 16.06.	Чт 16.06.	Конечная оплата	Платежное поручение	0%											
24		КТ4. Дизайн студии сг	0 дней	Ср 15.06.	Ср 15.06.			15.06											
25		Декоративный ремо	67 дней	Чт 05.05.	Пт 05.08.	Завершение строительства	Акт сдачи	0%											
26		Тендер	5 дней	Чт 05.05.	Ср 11.05.	Определен победитель	Протокол тендера	0%											
27		Заключение догово	4 дней	Чт 12.05.	Вт 17.05.	Договор заключен	Договор подписан	0%											

Лист диаграммы Ганта с базовым планом

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Результат	критерий оценки	Полугодие 1, 2														
								Полугодие 1, 2	Полугодие 2, 2													
								я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д	я		
28		Предоплата (50%)	1 день	Ср 18.05.	Ср 18.05.	Предоплата	Платежное поручение															0%
29		Строительные работ	27 дней	Ср 29.06.	Чт 04.08.	Завершение строительства	Акт сдачи															0%
30		Конечная оплата	1 день	Пт 05.08.	Пт 05.08.	Конечная оплата	Платежное поручение															0%
31		КТ5. Объект сдан в эксплуатацию	0 дней	Чт 04.08.	Чт 04.08.																	04.08
32		Обстановка мебели	2 дней	Пт 05.08.	Пн 08.08	Мебель доставлена	Мебель расставлена															0%
33		Выбор и приобретение	1 день	Пт 05.08.	Пт 05.08.	Выбрана мебель	Мебель оплачена															0%
34		Мобилизация и расстановка	1 день	Пн 08.08	Пн 08.08	Мебель доставлена	Мебель расставлена															0%
35		КТ6. Мебель расставлена	0 дней	Пн 08.08	Пн 08.08																	08.08
36		Закупка оборудования	10 дней	Пт 05.08.	Чт 18.08.	Оборудование установлено	Акт приема															0%
37		Тендер	1 день	Пт 05.08.	Пт 05.08.	Определен победитель	Протокол тендера															0%
38		Оплата оборудования	1 день	Пн 08.08	Пн 08.08	Оплата	Платежное поручение															0%
39		Поставка оборудования	7 дней	Вт 09.08.	Ср 17.08.	Оборудование доставлено	Акт приема															0%
40		Монтаж	1 день	Чт 18.08.	Чт 18.08.	Оборудование установлено	Акт приема															0%
41		КТ7. Оборудование введено в эксплуатацию	0 дней	Ср 17.08.	Ср 17.08.																	17.08
42		Создание рабочих условий	5 дней	Вт 09.08.	Пн 15.08	Условия для работы созданы	Рабочие условия созданы															0%
43		КТ8. Рабочие условия созданы	0 дней	Пн 08.08	Пн 08.08																	08.08
44		Наем сотрудников	23 дней	Вт 09.08.	Чт 08.09.	Кандидаты трудоустроены	Трудовые договора															0%
45		Подача объявления	1 день	Вт 09.08.	Вт 09.08.	Объявление размещено	СМИ															0%
46		Собеседования	15 дней	Ср 10.08.	Вт 30.08.	Собеседования проведены	Кандидаты отобраны															0%
47		Найм сотрудников	7 дней	Ср 31.08.	Чт 08.09.	Кандидаты трудоустроены	Трудовые договора															0%
48		КТ9. Сотрудники трудоустроены	0 дней	Вт 30.08.	Вт 30.08.																	30.08
49		Реклама	42 дней	Ср 31.08.	Чт 27.10.	Рекламная акция проведена	Увеличен объем заказов															0%
50		Поиск рекламного агентства	2 дней	Ср 31.08.	Чт 01.09.	найдено РА	удтверждено РА															0%
51		Поставление рекламных целей	5 дней	Пт 02.09.	Чт 08.09.	Цели поставлены	Цели утверждены															0%
52		Заключение договора	3 дней	Пт 09.09.	Вт 13.09.	Договор составлен	Договор подписан															0%
53		Предоплата (20%)	1 день	Ср 14.09.	Ср 14.09.	Предоплата	Платежное поручение															0%
54		Рекламная акция	30 дней	Чт 15.09.	Ср 26.10.	Рекламная акция проведена	Увеличен объем заказов															0%

Лист диаграммы Ганта с базовым планом

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Результат	критерий оценки	Полугодие 1, 2 Полугодие 2, 2 Пс															
								я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д	я			
55		Конечная оплата	1 день	Чт 27.10.	Чт 27.10.	Конечная оплата	Платежное поручение																0%
56		КТ10. Рекламная акци	0 дней	Ср 26.10.	Ср 26.10.																		26.10
57		Сдача объекта в экспл	1 день	Пт 28.10.	Пт 28.10.	Объект сдан в эксплуатацию	Акт сдачи в эксплуатацию																0%























Лист диаграммы Ганта с базовым планом

Критическая задача		Только окончание		Суммарная задача вручную	
Критическое прерывание		Только длительность		Суммарная задача проекта	
Критический ход выполнения		Базовая задача		Внешние задачи	
Задача		Базовое прерывание		Внешняя веха	
Прерывание		Базовая веха		Неактивная задача	
Ход выполнения задачи		Веха		Неактивная веха	
Задача вручную		Суммарный ход выполнения		Неактивная суммарная задача	
Только начало		Суммарная задача		Крайний срок	

Лист ресурсов

Ид.	Название ресурса	Тип	Краткое название	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на исполыз.	Начисление	Базовый календарь
1	Закупка оборудования	Затраты	З					Пропорциональн	
2	Руководитель проекта	Трудовой	Р	100%	300,00р./час	0,00р./час	0,00р.	Пропорциональн	Стандартный
3	Команда проекта (3чел.)	Трудовой	К	100%	660,00р./час	0,00р./час	0,00р.	Пропорциональн	Стандартный
4	Консалтинг	Затраты	К					Пропорциональн	
5	Строительно-монтажные работы	Затраты	С					Пропорциональн	
6	Прочее	Затраты	П					Пропорциональн	

msproj11		Лист назначения ресурсов								
Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Результат	критерий оценки	Предшес	Названия ресурсов	
1		Проект " Создани студи для фо	182 дней	Чт 17.02.22	Пт 28.10.22					
2		ТЭО	41 дней	Чт 17.02.22	Чт 14.04.22	Финансирование одобрено	Финансирование получено			
3		Инициация	10 дней	Чт 17.02.22	Ср 02.03.22	Протокол	Протокол утвержденный		Команда проекта (Зчел.	
4		Экономическое обоснован	21 дней	Чт 03.03.22	Чт 31.03.22	Разработан бизнес-план	Удтвержденный бизнес-план	3	Консалтинг[50 000,00р.]	
5		Взаимодействие с банками	7 дней	Пт 01.04.22	Пн 11.04.22	Соглашение	Подписанное соглашение	4	Руководитель проекта	
6		Выделение и распределен	3 дней	Вт 12.04.22	Чт 14.04.22	Финансирование одобрено	Финансирование получено	5		
7		КТ1. Финансирование получе	0 дней	Чт 14.04.22	Чт 14.04.22			6		
8		Помещение	8 дней	Пт 15.04.22	Вт 26.04.22	Составление договора с арендо	Договор об аренде подписан			
9		Поиск подходящих помеще	5 дней	Пт 15.04.22	Чт 21.04.22	Найдены подходящие помещения	Составлен список помещений	6	Команда проекта (Зчел.	
10		Заклучение договора об а	3 дней	Пт 22.04.22	Вт 26.04.22	Составление договора с арендо	Договор об аренде подписан	9	Руководитель проекта	
11		КТ2. Договор об аренде подп	0 дней	Чт 21.04.22	Чт 21.04.22			9		
12		Базовый ремонт помещени	49 дней	Пт 22.04.22	Ср 29.06.22	Завершение строительства	Акт сдачи			
13		Тендер	3 дней	Пт 22.04.22	Вт 26.04.22	Определен победитель	Протокол тендера	9	Команда проекта (Зчел.	
14		Заклучение договора	4 дней	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22	Договор заключен	Договор подписан	13	Руководитель проекта	
15		Предоплата (50%)	1 день	Вт 03.05.22	Вт 03.05.22	Предоплата	Платежное поручение	14	Строительно-монтажн	
16		Строительные работы	40 дней	Ср 04.05.22	Вт 28.06.22	Завершение строительства	Акт сдачи	15		
17		Конечная оплата	1 день	Ср 29.06.22	Ср 29.06.22	Конечная оплата	Платежное поручение	16	Строительно-монтажн	
18		КТ3. Завершен базовый ремо	0 дней	Вт 28.06.22	Вт 28.06.22			16		
19		Проектирование дизайна ст	37 дней	Ср 27.04.22	Чт 16.06.22	Завершение проектирование	Дизайн студии			
20		Тендер	4 дней	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22	Определен победитель	Протокол тендера	10	Команда проекта (Зчел.	
21		Заклучение договора	2 дней	Вт 03.05.22	Ср 04.05.22	Договор заключен	Договор подписан	20	Руководитель проекта	
22		Проектирование	30 дней	Чт 05.05.22	Ср 15.06.22	Завершение проектирование	Дизайн студии	21		
23		Оплата	1 день	Чт 16.06.22	Чт 16.06.22	Конечная оплата	Платежное поручение	22	Прочее[75 000,00р.]	
24		КТ4. Дизайн студии спроекти	0 дней	Ср 15.06.22	Ср 15.06.22			22		
25		Декоративный ремонт поме	67 дней	Чт 05.05.22	Пт 05.08.22	Завершение строительства	Акт сдачи			
26		Тендер	5 дней	Чт 05.05.22	Ср 11.05.22	Определен победитель	Протокол тендера	22	Команда проекта (Зчел.	
27		Заклучение договора	4 дней	Чт 12.05.22	Вт 17.05.22	Договор заключен	Договор подписан	26	Руководитель проекта	
28		Предоплата (50%)	1 день	Ср 18.05.22	Ср 18.05.22	Предоплата	Платежное поручение	27	Строительно-монтажн	
29		Строительные работы	27 дней	Ср 29.06.22	Чт 04.08.22	Завершение строительства	Акт сдачи	16		
30		Конечная оплата	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22	Конечная оплата	Платежное поручение	29	Строительно-монтажн	
31		КТ5. Объект сдан в эксплуата	0 дней	Чт 04.08.22	Чт 04.08.22			29		
32		Обстановка мебели	2 дней	Пт 05.08.22	Пн 08.08.22	Мебель доставлена	Мебель расставлена			
33		Выбор и приобретение ме	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22	Выбрана мебель	Мебель оплачена	29	Руководитель проекта	
34		Мобилизация и растановк	1 день	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22	Мебель доставлена	Мебель расставлена	33	Команда проекта (Зчел.	
35		КТ6. Мебель расставлена	0 дней	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22			34		

msproj11		Лист назначения ресурсов							
Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Результат	критерий оценки	Предшес	Названия ресурсов
36		Закупка оборудование	10 дней	Пт 05.08.22	Чт 18.08.22	Оборудование установлено	Акт приема		
37		Тендер	1 день	Пт 05.08.22	Пт 05.08.22	Определен победитель	Протокол тендера	29	Команда проекта (Зчел.
38		Оплата оборудования	1 день	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22	Оплата	Платежное поручение	37	Прочее[100 000,00р.]
39		Поставка оборудования	7 дней	Вт 09.08.22	Ср 17.08.22	Оборудовани доставлено	Акт приема	38	
40		Монтаж	1 день	Чт 18.08.22	Чт 18.08.22	Оборудование установлено	Акт приема	39	Команда проекта (Зчел.
41		КТ7. Оборудование введено	10 дней	Ср 17.08.22	Ср 17.08.22			39	
42		Создание рабочих условий	5 дней	Вт 09.08.22	Пн 15.08.22	Условия для работы созданы	Рабочие условия созданы	34	Команда проекта (Зчел.
43		КТ8. Рабочие условия созданы	10 дней	Пн 08.08.22	Пн 08.08.22			34	
44		Наем сотрудников	23 дней	Вт 09.08.22	Чт 08.09.22	Кандидаты трудоустроены	Трудовые договора		
45		Подача объявления	1 день	Вт 09.08.22	Вт 09.08.22	Объявление размещено	СМИ	34	Руководитель проекта
46		Собеседования	15 дней	Ср 10.08.22	Вт 30.08.22	Собеседования проведены	Кандидаты отобраны	45	Руководитель проекта
47		Найм сотрудников	7 дней	Ср 31.08.22	Чт 08.09.22	Кандидаты трудоустроены	Трудовые договора	46	Руководитель проекта
48		КТ9. Сотрудники трудоустроены	0 дней	Вт 30.08.22	Вт 30.08.22			46	
49		Реклама	42 дней	Ср 31.08.22	Чт 27.10.22	Рекламная акция проведена	Увеличен объем заказов		
50		Поиск рекламного агентства	2 дней	Ср 31.08.22	Чт 01.09.22	найден РА	удтверждено РА	46	Команда проекта (Зчел.
51		Поставление рекламных целей	5 дней	Пт 02.09.22	Чт 08.09.22	Цели поставлены	Цели утверждены	50	Команда проекта (Зчел.
52		Заключение договора	3 дней	Пт 09.09.22	Вт 13.09.22	Договор составлен	Договор подписан	51	Руководитель проекта
53		Предоплата (20%)	1 день	Ср 14.09.22	Ср 14.09.22	Предоплата	Платежное поручение	52	Прочее[10 000,00р.]
54		Рекламная акция	30 дней	Чт 15.09.22	Ср 26.10.22	Рекламная акция проведена	Увеличен объем заказов	53	
55		Конечная оплата	1 день	Чт 27.10.22	Чт 27.10.22	Конечная оплата	Платежное поручение	54	Прочее[40 000,00р.]
56		КТ10. Рекламная акция проведена	0 дней	Ср 26.10.22	Ср 26.10.22			54	
57		Сдача объекта в эксплуатацию	1 день	Пт 28.10.22	Пт 28.10.22	Объект сдан в эксплуатацию	Акт сдачи в эксплуатацию	55	Руководитель проекта

Лист использования ресурсов

Ид.	Название ресурса	Затраты	Подробности	Кв. 2, 2022				Кв. 3, 2022				Кв. 4, 2022		
				Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт		
	Не назначен	0,00р.	Затраты											
	Выделение и распределение финансирования	0,00р.	Затраты											
	КТ1. Финансирование получено	0,00р.	Затраты											
	КТ2. Договор об аренде подписан	0,00р.	Затраты											
	Строительные работы	0,00р.	Затраты											
	КТ3. Завершен базовый ремонт	0,00р.	Затраты											
	Проектирование	0,00р.	Затраты											
	КТ4. Дизайн студии спроектирован	0,00р.	Затраты											
	Строительные работы	0,00р.	Затраты											
	КТ5. Объект сдан в эксплуатацию	0,00р.	Затраты											
	КТ6. Мебель расставлена	0,00р.	Затраты											
	Поставка оборудования	0,00р.	Затраты											
	КТ7. Оборудование введено в эксплуатацию	0,00р.	Затраты											
	КТ8. Рабочие условия созданы	0,00р.	Затраты											
	КТ9. Сотрудники трудоустроены	0,00р.	Затраты											
	Рекламная акция	0,00р.	Затраты											
	КТ10. Рекламная акция проведена	0,00р.	Затраты											
1	Закупка оборудования	0,00р.	Затраты											
2	Руководитель проекта	115 200,00р.	Затраты			31 200,00р.	16 800,00р.				43 200,00р.	21 600,00р.		2 400,00р.
	Взаимодействие с банками	16 800,00р.	Затраты			16 800,00р.								
	Заключение договора об аренде	7 200,00р.	Затраты			7 200,00р.								
	Заключение договора	9 600,00р.	Затраты			7 200,00р.		2 400,00р.						
	Заключение договора	4 800,00р.	Затраты					4 800,00р.						
	Заключение договора	9 600,00р.	Затраты					9 600,00р.						
	Выбор и приобретение мебели	2 400,00р.	Затраты								2 400,00р.			
	Подана объявления	2 400,00р.	Затраты								2 400,00р.			
	Собеседования	36 000,00р.	Затраты								36 000,00р.			
	Найм сотрудников	16 800,00р.	Затраты								2 400,00р.	14 400,00р.		
	Заключение договора	7 200,00р.	Затраты									7 200,00р.		
	Сдача объекта в эксплуатацию	2 400,00р.	Затраты											2 400,00р.
3	Команда проекта (Зчел.)	221 760,00р.	Затраты	42 240,00р.	10 560,00р.	58 080,00р.	31 680,00р.				47 520,00р.	31 680,00р.		
	Инициация	52 800,00р.	Затраты	42 240,00р.	10 560,00р.									
	Поиск подходящих помещений	26 400,00р.	Затраты			26 400,00р.								
	Тендер	15 840,00р.	Затраты			15 840,00р.								
	Тендер	21 120,00р.	Затраты			15 840,00р.		5 280,00р.						
	Тендер	26 400,00р.	Затраты					26 400,00р.						
	Мобилизация и расстановка мебели	5 280,00р.	Затраты								5 280,00р.			
	Тендер	5 280,00р.	Затраты								5 280,00р.			
	Монтаж	5 280,00р.	Затраты								5 280,00р.			
	Создание рабочих условий	26 400,00р.	Затраты								26 400,00р.			
	Поиск рекламного агентства	10 560,00р.	Затраты								5 280,00р.	5 280,00р.		
	Поставление рекламных целей	26 400,00р.	Затраты									26 400,00р.		
4	Консалтинг	50 000,00р.	Затраты		50 000,00р.									
	Экономическое обоснование	50 000,00р.	Затраты		50 000,00р.									
5	Строительно-монтажные работы	600 000,00р.	Затраты				300 000,00р.	150 000,00р.			150 000,00р.			
	Предоплата (50%)	150 000,00р.	Затраты				150 000,00р.							
	Конечная оплата	150 000,00р.	Затраты					150 000,00р.						
	Предоплата (50%)	150 000,00р.	Затраты				150 000,00р.							
	Конечная оплата	150 000,00р.	Затраты								150 000,00р.			

Лист использования ресурсов

Ид.	Название ресурса	Затраты	Подробности	Кв. 2, 2022				Кв. 3, 2022				Кв. 4, 2022	
				Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	
6	Прочее	225 000,00р.	Затраты					75 000,00р.		100 000,00р.		10 000,00р.	40 000,00р.
	<i>Оплата</i>	75 000,00р.	Затраты					75 000,00р.					
	<i>Оплата оборудования</i>	100 000,00р.	Затраты							100 000,00р.			
	<i>Предоплата (20%)</i>	10 000,00р.	Затраты									10 000,00р.	
	<i>Конечная оплата</i>	40 000,00р.	Затраты										40 000,00р.
