

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Кафедра «Производственный менеджмент»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

По дисциплине «Управление проектами»

ТЕМА: Изучение интерфейса программы Microsoft Project 2016

ВЫПОЛНИЛ:

Студент 3 курса

Группа 4171111

« » 20 г.

_____ (А.Р.Акбарова)

ПРОВЕРИЛ:


д.э.н., профессор,


« » 20 г.







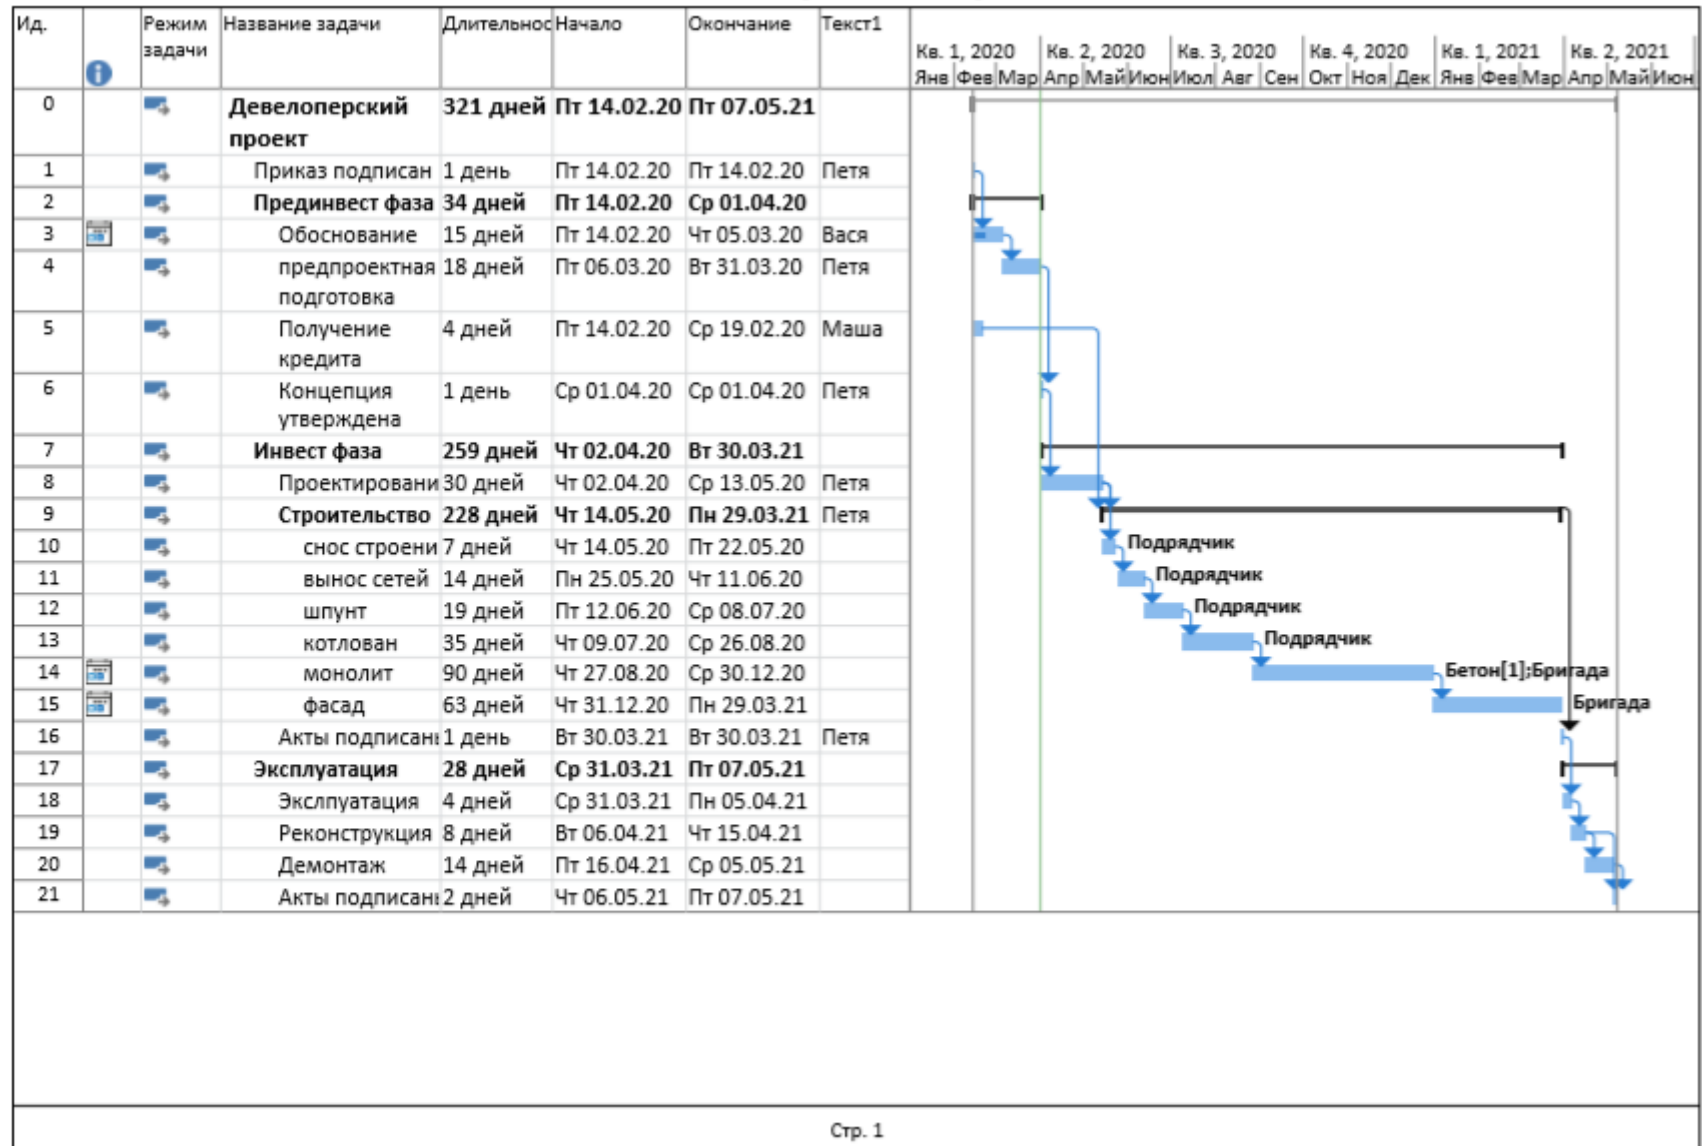












_____ (А.С.Пуряев)


Набережные Челны, 2020

Диаграмма Ганта первичный





Проект: Девелоперский проект Дата: Ср 01.04.20	Задача		Задача вручную	
	Прерывание		Только длительность	
	Веха		Суммарное сведение вручную	
	Суммарная задача		Суммарная задача вручную	
	Суммарная задача проекта		Только начало	
	Внешние задачи		Только окончание	
	Внешняя веха		Крайний срок	
	Неактивная задача		Ход выполнения	
	Неактивная веха		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Неактивная суммарная задача			



Проект: Девелоперский проект Дата: Ср 01.04.20	Задача		Только длительность	
	Прерывание		Суммарное сведение вручную	
	Вега		Суммарная задача вручную	
	Суммарная задача		Только начало	
	Суммарная задача проекта		Только окончание	
	Внешние задачи		Крайний срок	
	Внешняя вега		Критическая задача	
	Неактивная задача		Критическое прерывание	
	Неактивная вега		Ход выполнения	
	Неактивная суммарная задача		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Задача вручную			

Диаграмма Ганта с отслеживанием (базовый план, фрагмент отслеживания)

Проект1Акбар																				
Ид.	Название задачи	Факт. начало	Факт. окончание	% завершения	Физ. % завершения	Факт. длит.	Ост. длит.	Факт. затраты	Полугодие 1, 2 Полугодие 2, 2 Полугодие 1, 2 По											
									Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
0	Девелоперский проект	Пт 14.02.20	НД	2%	0%	5,42 дней	315,58 дней	0,00р.												
1	Приказ подписан	Пт 14.02.20	НД	0%	0%	0 дней	1 день	0,00р.												
2	Прединвест фаза	Пт 14.02.20	НД	14%	0%	4,92 дней	29,08 дней	0,00р.												
3	Обоснование	Пт 14.02.20	НД	37%	0%	5,5 дней	9,5 дней	0,00р.												
4	предпроектная	НД	НД	0%	0%	0 дней	18 дней	0,00р.												
5	Получение кред	НД	НД	0%	0%	0 дней	4 дней	0,00р.												
6	Концепция утве	НД	НД	0%	0%	0 дней	1 день	0,00р.												
7	Инвест фаза	НД	НД	0%	0%	0 дней	259 дней	0,00р.												
8	Проектировани	НД	НД	0%	0%	0 дней	30 дней	0,00р.												
9	Строительство	НД	НД	0%	0%	0 дней	228 дней	0,00р.												
10	снос строени	НД	НД	0%	0%	0 дней	7 дней	0,00р.												
11	вынос сетей	НД	НД	0%	0%	0 дней	14 дней	0,00р.												
12	шпунт	НД	НД	0%	0%	0 дней	19 дней	0,00р.												
13	котлован	НД	НД	0%	0%	0 дней	35 дней	0,00р.												
14	монолит	НД	НД	0%	0%	0 дней	90 дней	0,00р.												
15	фасад	НД	НД	0%	0%	0 дней	63 дней	0,00р.												
16	Акты подписан	НД	НД	0%	0%	0 дней	1 день	0,00р.												
17	Эксплуатация	НД	НД	0%	0%	0 дней	28 дней	0,00р.												
18	Эксплуатация	НД	НД	0%	0%	0 дней	4 дней	0,00р.												
19	Реконструкция	НД	НД	0%	0%	0 дней	8 дней	0,00р.												
20	Демонтаж	НД	НД	0%	0%	0 дней	14 дней	0,00р.												
21	Акты подписан	НД	НД	0%	0%	0 дней	2 дней	0,00р.												



Критический ход выполнения		Базовая веха	
Задача		Веха	
Прерывание		Суммарный ход выполнения	
Ход выполнения задачи		Суммарная задача	
Задача вручную		Суммарная задача вручную	
Только начало		Суммарная задача проекта	
Только окончание		Внешние задачи	
Только длительность		Внешняя веха	
Критическая задача		Неактивная задача	
Критическое прерывание		Неактивная веха	
Базовая задача		Неактивная суммарная задача	
Базовое прерывание		Крайний срок	

Пересохранение базового плана для задач стадии строительства

Проект1Акбар									
Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Текст1	Предс	Названия ресурсов	
Полугодие 1, 20 Полугодие 2, 20 Полугодие 1, 20 Полу									
Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А									
0		Девелоперский проект	351 дней	Пт 14.02.20	Пт 18.06.21				2%
1		Приказ подписан	1 день	Пт 14.02.20	Пт 14.02.20	Петя			0%
2		Прединвест фаза	34 дней	Пт 14.02.20	Ср 01.04.20				14%
3		Обоснование	15 дней	Пт 14.02.20	Чт 05.03.20	Вася	1		37%
4		предпроектная	18 дней	Пт 06.03.20	Вт 31.03.20	Петя	3		0%
5		Получение кред	4 дней	Пт 14.02.20	Ср 19.02.20	Маша			0%
6		Концепция утве	1 день	Ср 01.04.20	Ср 01.04.20	Петя	4		0%
7		Инвест фаза	289 дней	Чт 02.04.20	Вт 11.05.21				0%
8		Проектировани	60 дней	Чт 02.04.20	Ср 24.06.20	Петя	6		0%
9		Строительство	228 дней	Чт 25.06.20	Пн 10.05.21	Петя	8;5		0%
10		снос строени	7 дней	Чт 25.06.20	Пт 03.07.20		8	Подрядчик	0%
11		вынос сетей	14 дней	Пн 06.07.20	Чт 23.07.20		10	Подрядчик	0%
12		шпунт	19 дней	Пт 24.07.20	Ср 19.08.20		11	Подрядчик	0%
13		котлован	35 дней	Чт 20.08.20	Ср 07.10.20		12	Подрядчик	0%
14		монолит	90 дней	Чт 08.10.20	Ср 10.02.21		13	Бетон[1];Бригада	0%
15		фасад	63 дней	Чт 11.02.21	Пн 10.05.21		14	Бригада	0%
16		Акты подписан	1 день	Вт 11.05.21	Вт 11.05.21	Петя	9		0%
17		Эксплуатация	28 дней	Ср 12.05.21	Пт 18.06.21				0%
18		Эксплуатация	4 дней	Ср 12.05.21	Пн 17.05.21		16		0%
19		Реконструкция	8 дней	Вт 18.05.21	Чт 27.05.21		18		0%
20		Демонтаж	14 дней	Пт 28.05.21	Ср 16.06.21		19		0%
21		Акты подписан	2 дней	Чт 17.06.21	Пт 18.06.21		19;20		0%




























Базовая веха		Веха	
Базовая суммарная задача		Суммарный ход выполнения	
Критический ход выполнения		Суммарная задача	
Задача		Суммарная задача вручную	
Прерывание		Суммарная задача проекта	
Ход выполнения задачи		Внешние задачи	
Задача вручную		Внешняя веха	
Только начало		Неактивная задача	
Только окончание		Неактивная веха	
Только длительность		Неактивная суммарная задача	
Критическая задача		Крайний срок	
Критическое прерывание		Базовая задача	
Базовое прерывание			

Диаграмма Ганта с оформленной сеткой, с изменением цвета диаграмм и с выходными днями

Ид.	Название задачи	Факт. начало	Факт. окончание	% завершения	Физ. % завершения	Факт. длит.	20							17 Фев '20					24 Фев '20																				
							с	ч	п	с	в	п	в	с	ч	п	с	в	п	в	с	ч	п																
0	Девелоперский проект	Пт 14.02.20	НД	2%	0%	5,42 дней																																	
1	Приказ подписан	Пт 14.02.20	НД	0%	0%	0 дней																																	
2	Прединвест фаза	Пт 14.02.20	НД	14%	0%	4,92 дней																																	
3	Обоснование	Пт 14.02.20	НД	37%	0%	5,5 дней																																	
4	предпроектная подготовка	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
5	Получение кредита	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
6	Концепция утверждена	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
7	Инвест фаза	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
8	Проектировани	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
9	Строительство	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
10	снос строени	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
11	вынос сетей	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
12	шпунт	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
13	котлован	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
14	монолит	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
15	фасад	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
16	Акты подписань	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
17	Эксплуатация	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
18	Эксплуатация	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
19	Реконструкция	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
20	Демонтаж	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	
21	Акты подписань	НД	НД	0%	0%	0 дней																																	



Проект: Девелоперский проект Дата: Ср 01.04.20	Задача		Только длительность	
	Прерывание		Суммарное сведение вручную	
	Веха		Суммарная задача вручную	
	Суммарная задача		Только начало	
	Суммарная задача проекта		Только окончание	
	Внешние задачи		Крайний срок	
	Внешняя веха		Критическая задача	
	Неактивная задача		Критическое прерывание	
	Неактивная веха		Ход выполнения	
	Неактивная суммарная задача		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Задача вручную			
